

Bericht der Projektsteuerung HWSB Barby 2013

Stadtratssitzung

Klaus-Holger Elwert, 06.12.2018



Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Maßnahmenübersicht

Stand Gesamtprogramm – Förderung und Investition

Sachstand Förderung	Summe Mio €		Anteil %	
Förderung gesamt beantragt, davon:	54,1	(52,6)	100	
Förderung bewilligt	49,9	(48,3)	92	(92)
Förderung Nachanträge offen	4,2	(4,3)	8	(8)

Sachstand Investition	Summe Mio €		Anteil %	
Mittel Investition gesamt, davon:	54,1	(52,6)	100	
Mittel beauftragt	29,4	(21)	54,3	(40)
Mittel verwendet	23	(13,9)	42,5	(26,4)
Mittel bereitstehend (tw. offen)	31,1	(41,1)	57,5	(73,6)

Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Maßnahmenübersicht

Sachstand Durchführung

Nach Maßnahmen	214 Maßnahmen		
Abgeschlossen	98	(Juni: 88)	46 %
im Bau	13	(Juni: 27)	6 %
Bauleistungen beauftragt	7	(Juni: 23)	3 %
Aktuelle Vergabeverfahren Bauleistungen	18	(Juni: 13)	8,5 %
in Planung	78	(Juni: 91)	36,5 %

Maßnahmenübersicht

Sachstand Durchführung

Nach Kosten	Mio €		
Abgeschlossen	20,4	(Juni: 13,5)	41 %
im Bau	6,5	(Juni: 11,7)	13 %
Bauleistungen beauftragt	2,5	(Juni: 2,4)	5 %
Aktuelle Vergabeverfahren Bauleistungen	3,5	(Juni: 1,7)	7 %
in Planung	17	(Juni: 19,3)	34 %
Gesamt	49,9	(Juni: 48,3)	100 %

Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände**
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Ortsteile

Barby – Übersicht Durchführungsstände

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung



Ortsteile

Breitenhagen – Übersicht Durchführungsstände

aktuelle Maßnahmenstände


Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

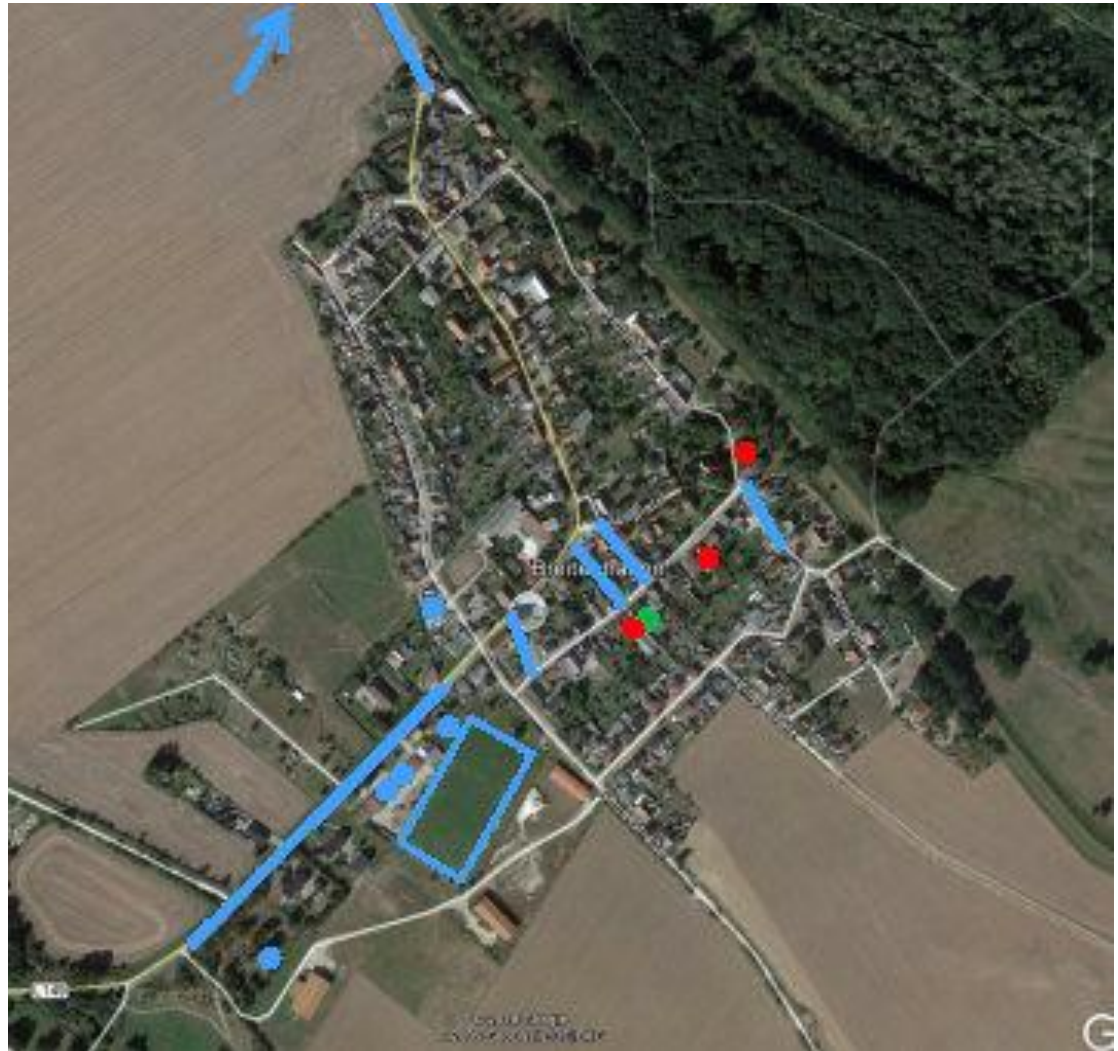

Ortsteile

Groß Rosenberg – Übersicht Durchführungsstände

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung



Ortsteile

Klein Rosenberg – Übersicht Durchführungsstände

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung



Ortsteile

Lödderitz – Übersicht Durchführungsstände

aktuelle Maßnahmenstände


Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

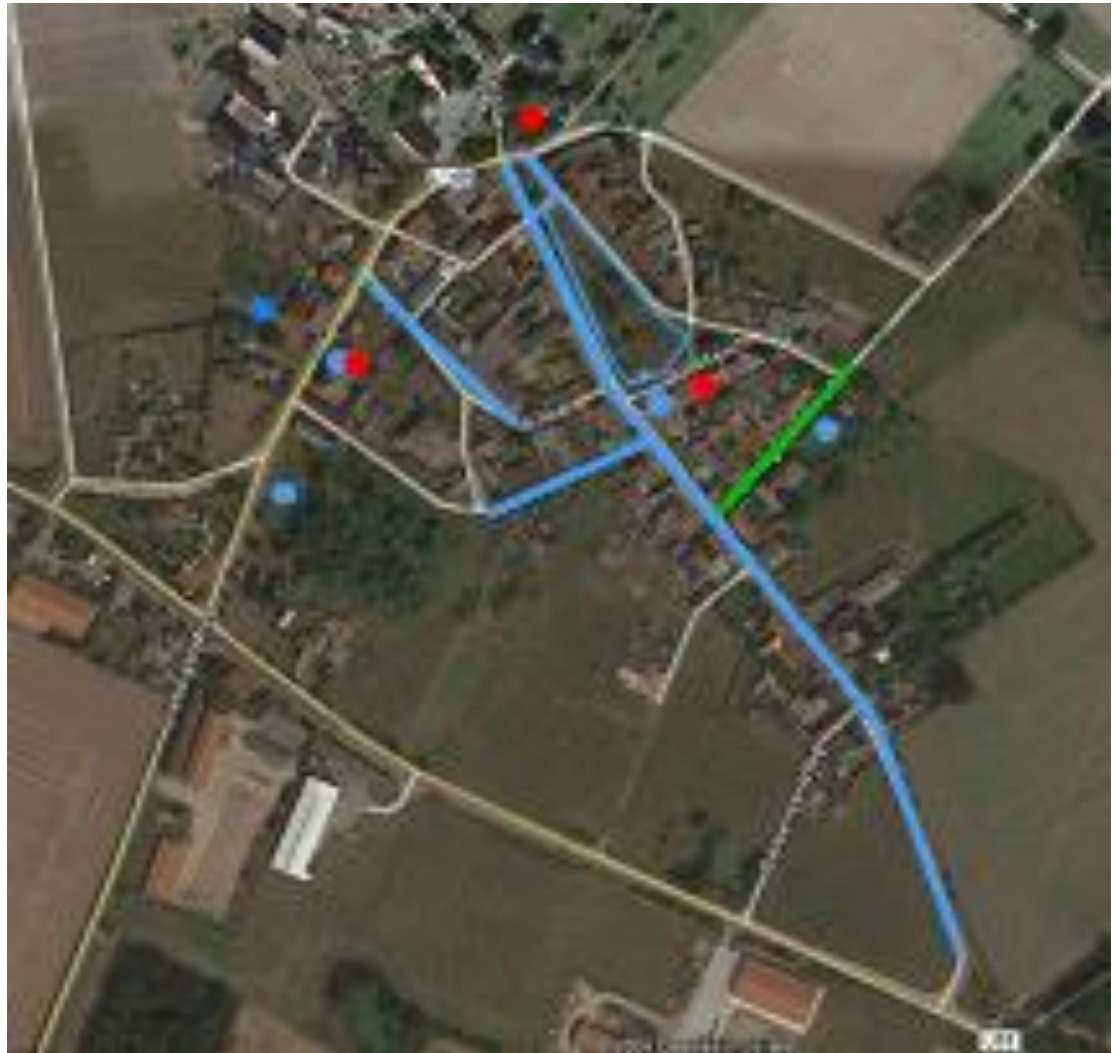

Ortsteile

Tornitz/ Werkleitz – Übersicht Durchführungsstände

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung



Ortsteile

Glinde/ Pömmelte – Übersicht Durchführungsstände

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

Maßnahmen in Pömmelte:
Fertiggestellt



Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Einzelmaßnahmen

Auswahl – Stand der Durchführung

Dorfgemeinschaftshaus Breitenhagen

Gebäude und Freianlagen
baulich fertiggestellt

Aktuell: Inbetriebnahmen, Behördliche
Abnahme Dezember 2018

Eröffnung: 19. Januar 2019



Einzelmaßnahmen

Auswahl – Stand der Durchführung

Georgsplatz, Georgstraße Groß Rosenberg

Beide Straßen fertiggestellt



Einzelmaßnahmen

Auswahl – Stand der Durchführung

Straßenbau Klein Rosenberg

Schlossstraße: Restarbeiten

Edelbergstraße: fertiggestellt

Saalweg, Angergasse: Im Bau

Noch offen: Regenwasserkanal Stutenhof



Einzelmaßnahmen

Auswahl – Stand der Durchführung

Straßenbau Lödderitz

Teich/ Weg, Dorfstraße mit Buswendeplatz fertiggestellt

Im Winkel fertiggestellt

Breitenhagener Straße im Bau



Einzelmaßnahmen

Auswahl – Stand der Durchführung

Dorfstraße Glinde

Bereich Kirche fertiggestellt

Dorfstraße Baustand ca. 75% Baulänge

Baustelle wird winterfest gemacht und Straße freigegeben

Clemensfahrt, Weg zum Deich fertig



Einzelmaßnahmen

Auswahl – Stand der Durchführung

Barby Ziegeleiweg, Fahrtweg

Fahrtweg: Restarbeiten

Durchlass Landgraben: fertiggestellt

Aktuell Straßenbau Ziegeleiweg

Umleitung über Wiesenweg, Fahrtweg

