

Bericht der Projektsteuerung HWSB Barby 2013

Stadtratssitzung

Stefan Gollmer, 25.07.2019



Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Maßnahmenübersicht

Stand Gesamtprogramm – Förderung und Investition

Sachstand Förderung	Summe Mio €	Anteil
Förderung gesamt beantragt (Hochrechnung PS), davon:	54,10	100,00 %
Förderung bewilligt	50,55	93,43 %
Förderung offen	3,55	6,57 %
Förderung abgelehnt	0,00	0,00 %

Sachstand Investition bewilligt	Summe Mio €	Anteil
Mittel Investition	50,55	100,00 %
Mittel beauftragt	37,50	74,18 %
Mittel noch offen	13,05	25,82 %

Maßnahmenübersicht

Sachstand Durchführung/ Abrechnung

Nach Kosten	Mio €	Anteil
Gesamt	50,55	100,00 %
Abgerechnet	29,85	59,05 %
Planung/ Bauausführung beauftragt	7,63	15,09 %
offen	13,07	25,86 %

Maßnahmenübersicht

Sachstand Durchführung

Nach Baumaßnahmen	217 Maßnahmen	Anteil
Baulich abgeschlossen	121	55,76 %
in Bauausführung (Lph 8)	29	13,36 %
in Planung und Vergabe (Lph 1-7)	67	30,88 %

Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Ortsteile

Barby – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände


Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

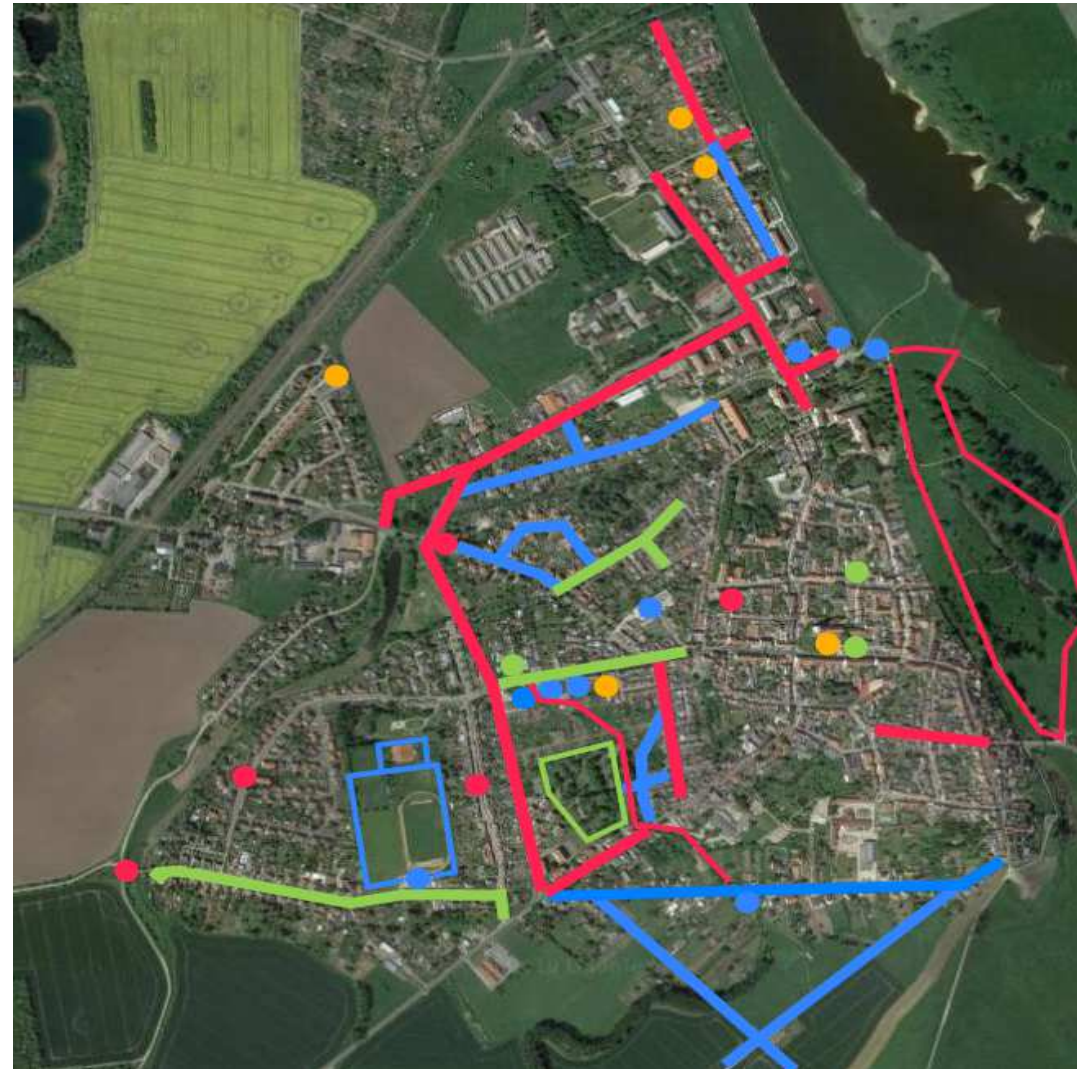

Ortsteile

Barby – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
601BA01 ländliche Wege Gutachten Süd					
646BA02 Gewässer Großer Dorfsee/ krumme Renne					
647BA03 ländliche Wege Gutachten Nord					
649BA04 Gewässer Barbyer Landgraben					
661BA05 Weg 089026_071 Elbwerder Barby					
662BA06 Weg 367002_026					
663BA07 Weg 367002_027					
664BA08 Weg 367002_029					
665BA09 Weg 367002_031					
666BA10 Weg 367002_034					
667BA11 Weg 367010_002					
668BA12 Weg 367010_004					
669BA13/ 670BA14 Wege 367010_010/ 367019_010					
676BA16/ 679BA18 Wege 367025_009/ 367025_020					

Ortsteile

Breitenhagen – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung



Ortsteile


Breitenhagen – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
603BR03 Weg 089026_902					
604BR02 Weg 367004_006					
605BR01 Weg 367004_011					
606BR07 Weg 367004_003					
607BR06 Weg 367004_004					
608BR08 Weg 367004_007					
609BR04 Weg 367004_009					
610BR10 Weg 367004_005					
611BR09 Weg 367004_008					
612BR08 Weg 367004_010					
614BR10 Weg 089026_064					

Ortsteile

Gr. Rosenberg – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände
Fertiggestellt
In Bau
Bau beauftragt
Bau in Vergabe
In Planung

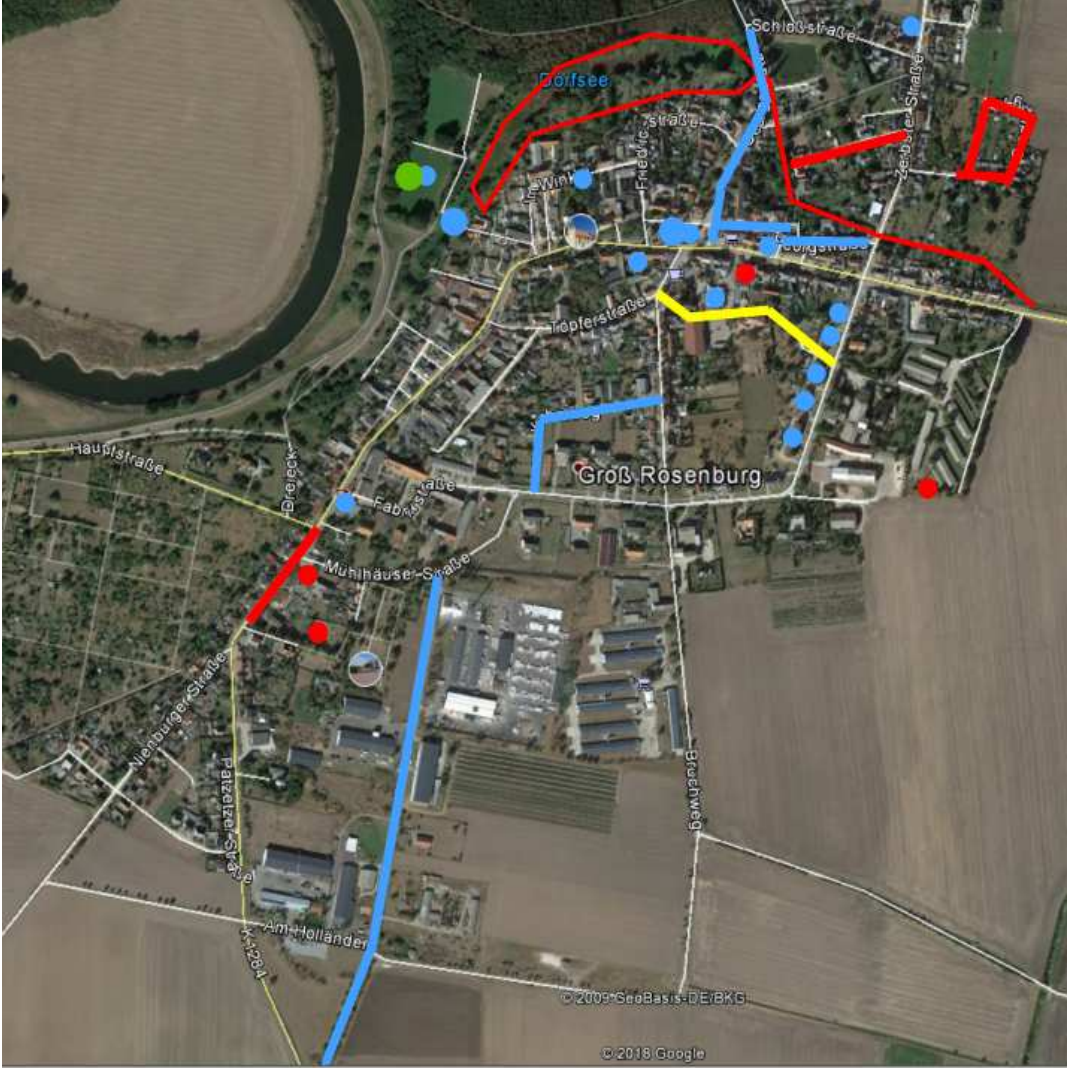

Ortsteile

Kl. Rosenberg – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände


Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

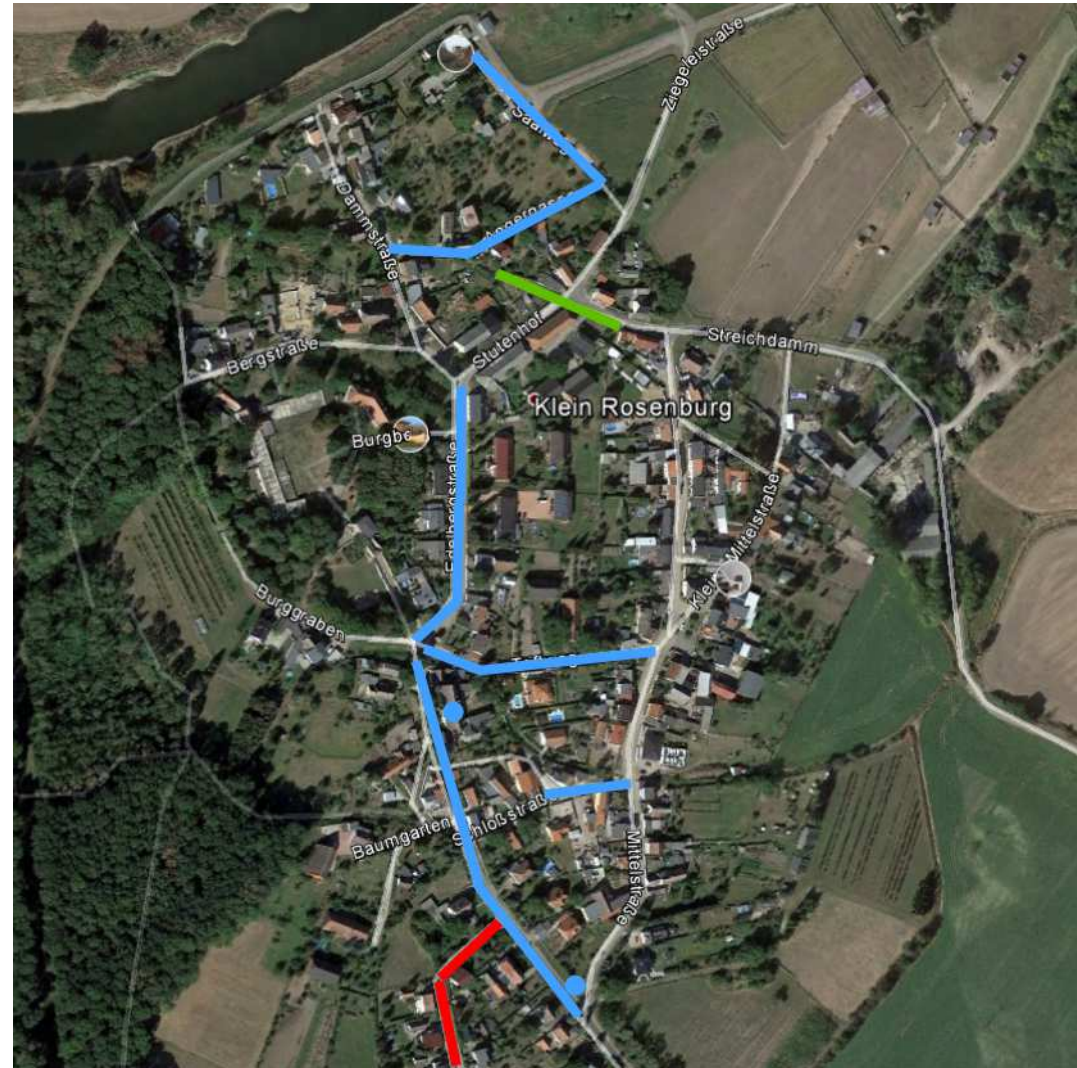

Ortsteile

Groß Rosenberg – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
613GR02 Weg 089026_065					
615GR07 Weg 367014_013					
618GR12 Weg 367014_005					
619GR11 Weg 367014_008					
620GR10 Weg 367014_016					
623GR09 Weg 367014_006					
624GR26 Weg 367014_003					

Ortsteile

Lödderitz – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände


Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

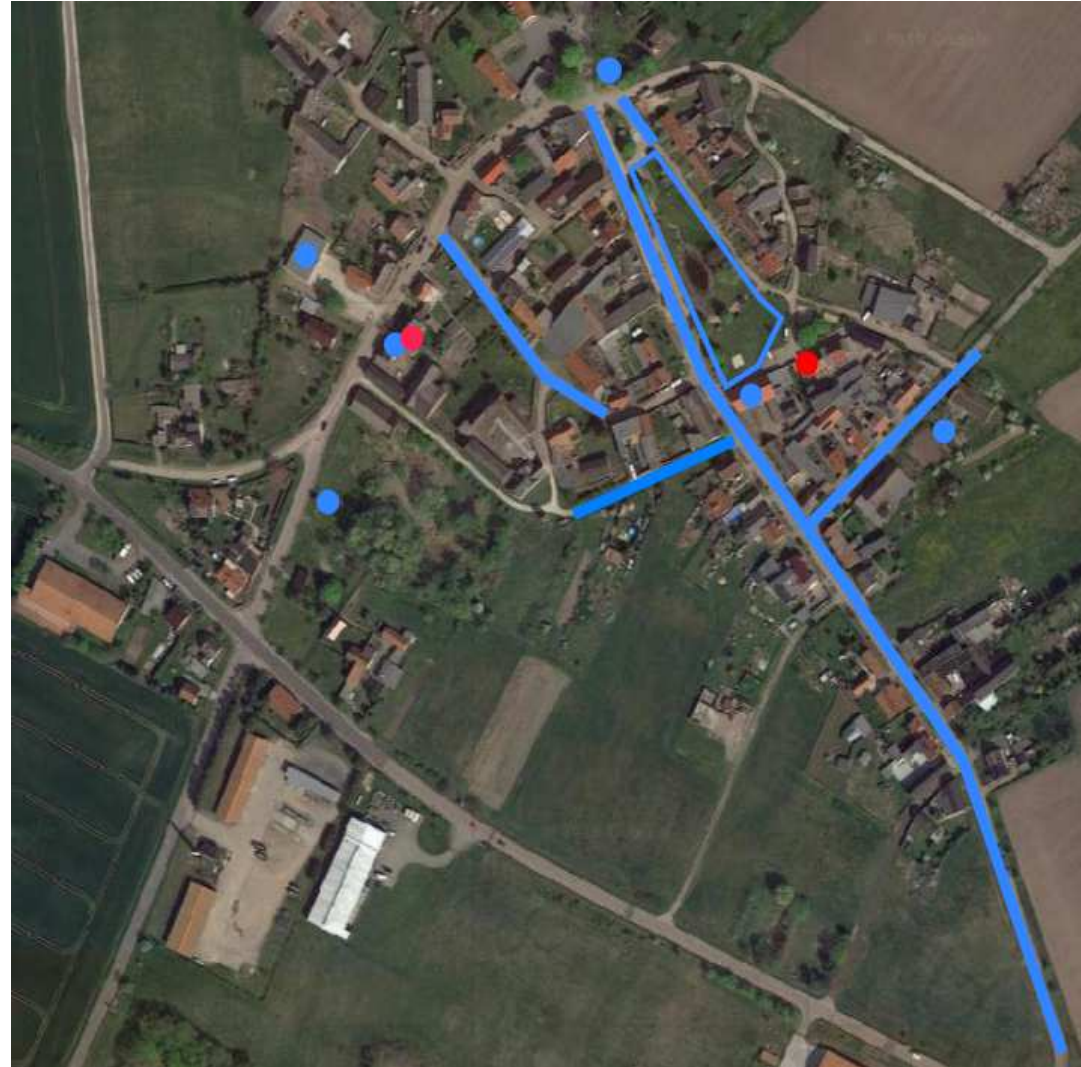

Ortsteile

Lödderitz – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
625LÖ02 Weg 367017_009					
626LÖ14 Weg 367017_011					
627LÖ12 Weg 367017_005					
628LÖ10 Weg 367017_007					
641LÖ15 Weg 367017_008					

Ortsteile

Tornitz – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung



Ortsteile

Tornitz – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
602TO04 Weg 367002_001					
640TO01 Weg zur alten Ziegelei					
644TO02 Weg 089026_069					
645TO03 Weg 089026_070					
648TO05 Weg 367002_002					
650TO06 Weg 367002_003					
651TO07/ 681TO23 Wege 367002_004/ 367025_028					
652TO08 Weg 367002_005					
653TO09 Weg 367002_006					
654TO10 Weg 367002_007					
655TO11 Weg 367002_008					
656TO12 Weg 367002_009					
657TO13 Weg 367002_012					
658TO14 Weg 367002_013					
659TO15 Weg 367002_014					
660TO16/ 678BA17 Wege 367002_019/ 367025_014					
671TO17 Weg 367025_001					
673TO19 Weg 367025_003					
674TO20 Weg 367025_004					
677TO21 Weg 367025_010					
680TO22 Weg 367025_021					
682TO24 Gewässer Tränke Werkleitz					

Ortsteile

Glinde – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt


In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

Maßnahmen in Pömmelte:
Fertiggestellt

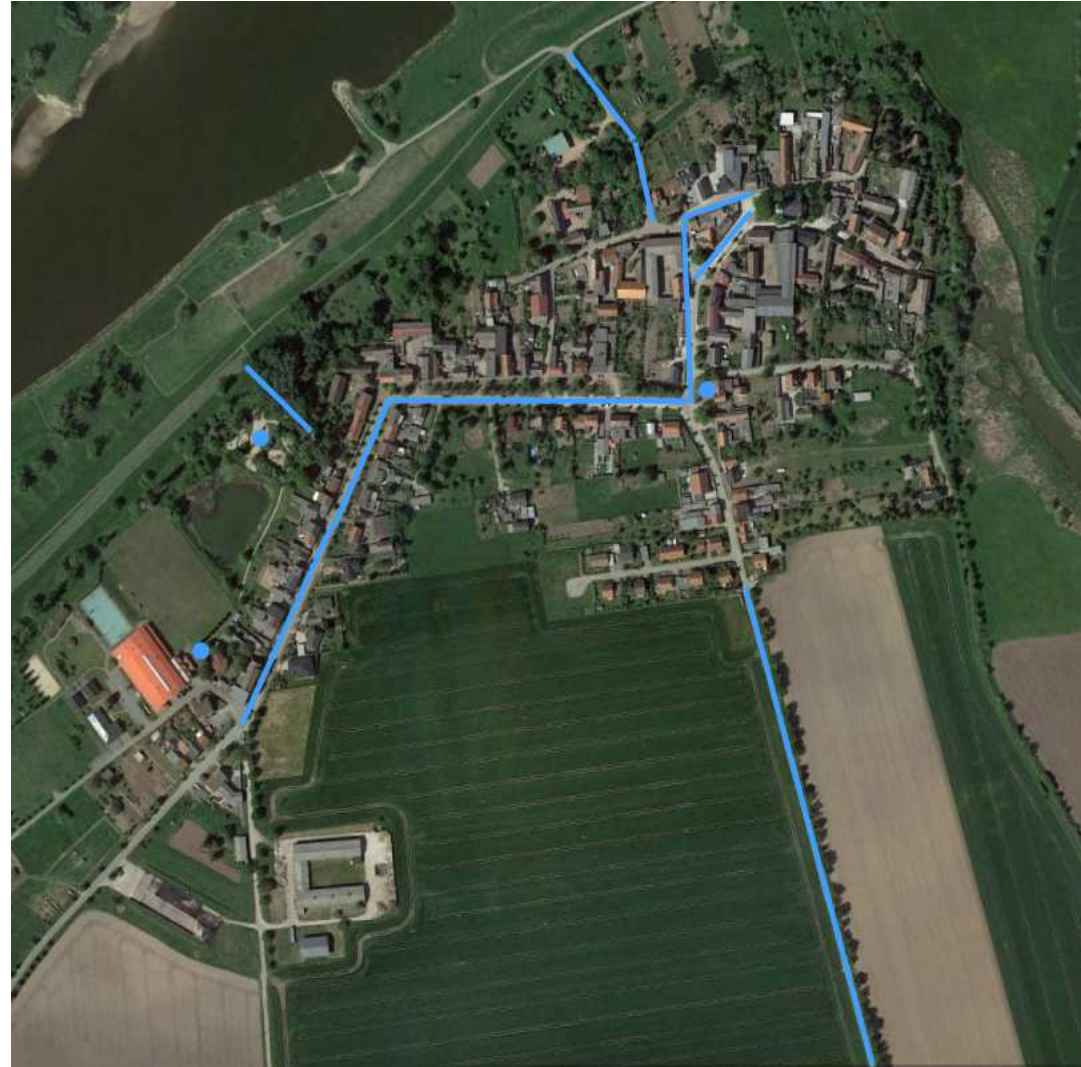

Ortsteile

Sachsendorf – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
629SA09 Weg 089026_059					
630SA08 Weg 089026_061					
631SA07 Weg 367022_004					
632SA06 Weg 367022_005					
633SA05 Weg 367022_006					
634SA04 Weg 367022_008					
635SA02 Weg 367030_011					

Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

Einzelmaßnahmen Auswahl – Stand der Durchführung

Groß Rosenberg

Durchlass Rosmarienstr.: fertiggestellt

Sportplatz: im Bau



Einzelmaßnahmen Auswahl – Stand der Durchführung

Lödderitz

Alte Feuerwehr



Einzelmaßnahmen

Auswahl – Stand der Durchführung

Barby

Fahrtweg: fertiggestellt

Ziegeleiweg: fertiggestellt

Magdeburger Tor: im Bau

Gribehner Weg: im Bau

Gethsemanestr.: im Bau



Einzelmaßnahmen Auswahl – Stand der Durchführung

Breitenhagen: Weg 633 SA 05 (im Bau)

Tornitz: Weg 651 TO 07 (fertig)

Tornitz: Weg 681 TO 23 (fertig)

