

# Bericht der Projektsteuerung HWSB Barby 2013

Stadtratssitzung  
Stefan Gollmer,



# Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

# Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

# Maßnahmenübersicht

Stand Gesamtprogramm – Förderung und Investition

Sachstand Förderung	Summe Mio €	Anteil
Förderung gesamt beantragt (Hochrechnung PS), davon:	54,10	100,00 %
Förderung bewilligt <b>incl. Honorar PS</b>	<b>51,00</b>	<b>94,27 %</b>
Förderung offen	<b>3,10</b>	<b>5,73 %</b>
Förderung abgelehnt	0,00	0,00 %

Sachstand Investition bewilligt	Summe Mio €	Anteil
Mittel Investition	<b>51,00</b>	<b>100,00 %</b>
Mittel beauftragt <b>Stand <u>Ende</u> Januar 2020</b>	<b>40,20</b>	<b>78,82 %</b>
Mittel noch offen	<b>10,80</b>	<b>21,18 %</b>

# Maßnahmenübersicht

Sachstand Durchführung/ Abrechnung

Nach Kosten	Mio €	Anteil
Gesamt	<b>51,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Abgerechnet</b>	<b>36,00</b>	<b>70,59 %</b>
Planung/ Bauausführung beauftragt	<b>5,60</b>	<b>10,98 %</b>
offen	<b>9,40</b>	<b>18,43 %</b>

# Maßnahmenübersicht

Sachstand Durchführung

Nach Baumaßnahmen	216 Maßnahmen	Anteil
Baulich abgeschlossen	125	57,87 %
in Bauausführung (Lph 8)	26	12,04 %
in Planung und Vergabe (Lph 1-7)	65	30,09 %

# Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

# Ortsteile

## Barby – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

### aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung





# Ortsteile

## Barby – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
601BA01 ländliche Wege Gutachten Süd					
646BA02 Gewässer Großer Dorfsee/ krumme Renne					
647BA03 ländliche Wege Gutachten Nord					
649BA04 Gewässer Barbyer Landgraben					
661BA05 Weg 089026_071 Elbwerder Barby					
662BA06 Weg 367002_026					
663BA07 Weg 367002_027					
664BA08 Weg 367002_029					
665BA09 Weg 367002_031					
666BA10 Weg 367002_034					
667BA11 Weg 367010_002					
668BA12 Weg 367010_004					
669BA13/ 670BA14 Wege 367010_010/ 367019_010					
676BA16/ 679BA18 Wege 367025_009/ 367025_020					

# Ortsteile

## Breitenhagen – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

### aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung



# Ortsteile

## Breitenhagen – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
603BR03 Weg 089026_902					
604BR02 Weg 367004_006					
605BR01 Weg 367004_011					
606BR07 Weg 367004_003					
607BR06 Weg 367004_004					
608BR08 Weg 367004_007					
609BR04 Weg 367004_009					
610BR10 Weg 367004_005					
611BR09 Weg 367004_008					
612BR08 Weg 367004_010					
614BR10 Weg 089026_064					



# Ortsteile

## Kl. Rosenberg – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

### aktuelle Maßnahmenstände


Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

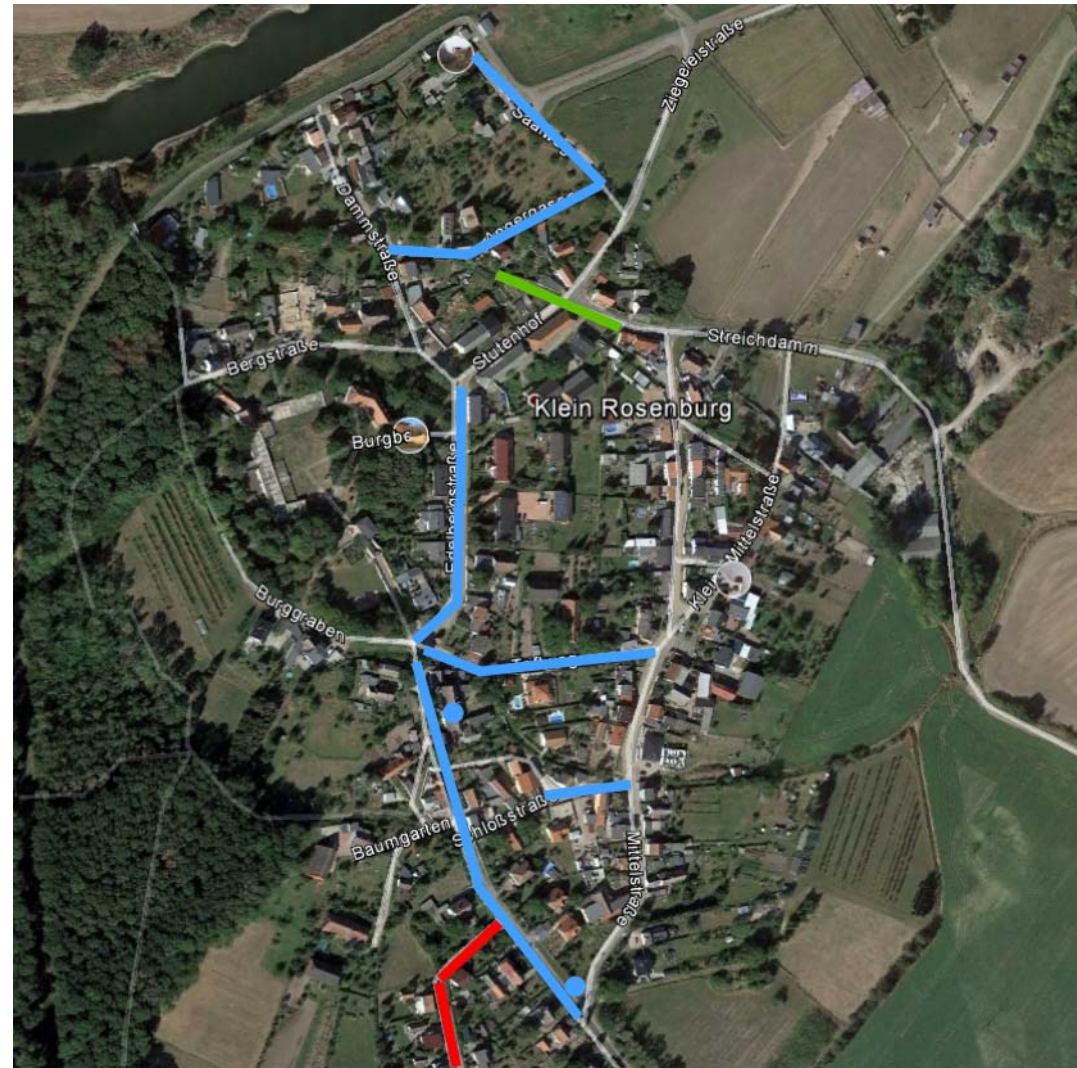

## Ortsteile

# Groß Rosenberg – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
613GR02 Weg 089026_065					
615GR07 Weg 367014_013					
618GR12 Weg 367014_005					
619GR11 Weg 367014_008					
620GR10 Weg 367014_016					
623GR09 Weg 367014_006					
624GR26 Weg 367014_003					

# Ortsteile

## Lödderitz – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

### aktuelle Maßnahmenstände


Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

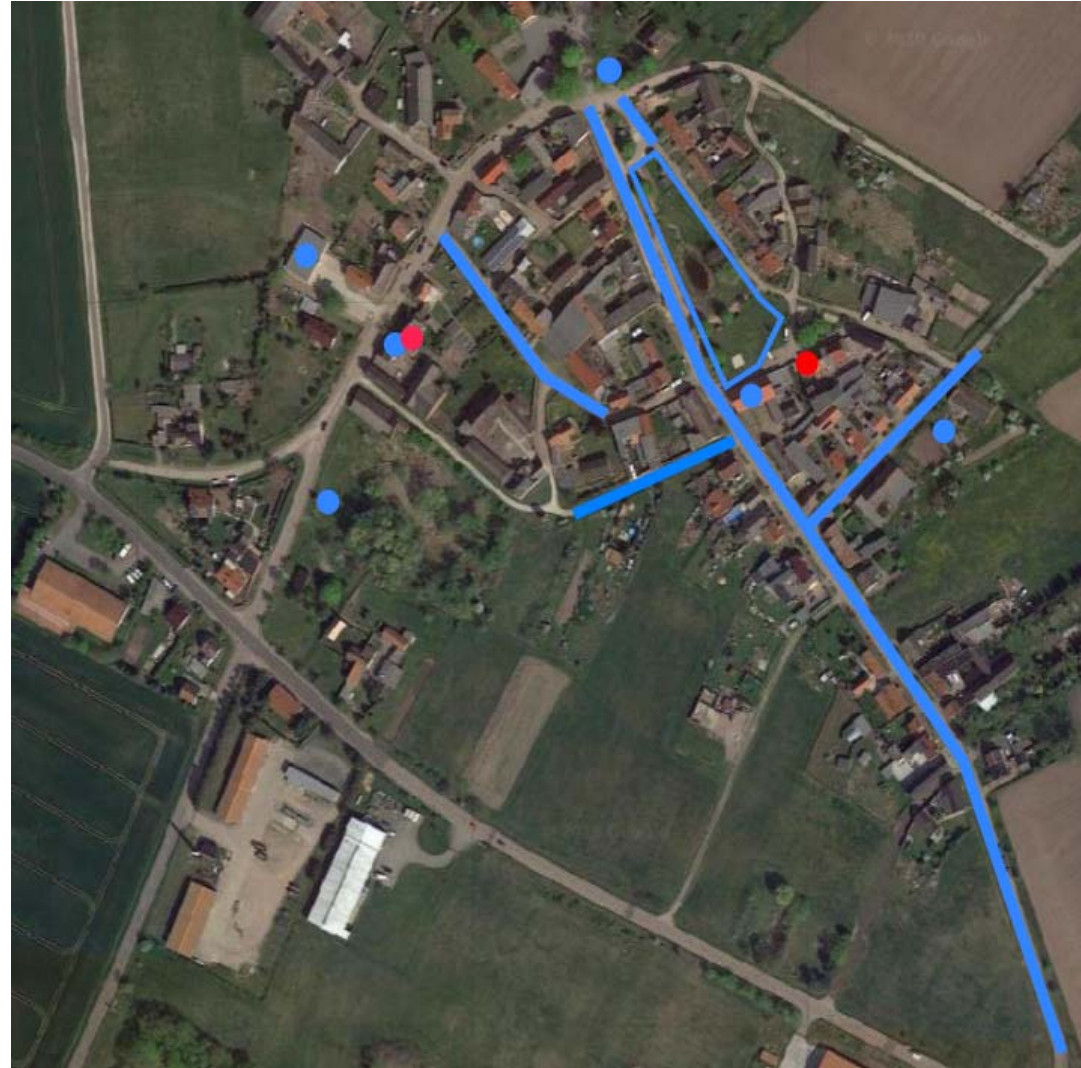

## Ortsteile

### Lödderitz – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
625LÖ02 Weg 367017_009					
626LÖ14 Weg 367017_011					
627LÖ12 Weg 367017_005					
628LÖ10 Weg 367017_007					
641LÖ15 Weg 367017_008					



# Ortsteile

## Tornitz – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

### aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt

In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung



# Ortsteile

## Tornitz – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
602TO04 Weg 367002_001					
640TO01 Weg zur alten Ziegelei					
644TO02 Weg 089026_069					
645TO03 Weg 089026_070					
648TO05 Weg 367002_002					
650TO06 Weg 367002_003					
651TO07/ 681TO23 Wege 367002_004/ 367025_028					
652TO08 Weg 367002_005					
653TO09 Weg 367002_006					
654TO10 Weg 367002_007					
655TO11 Weg 367002_008					
656TO12 Weg 367002_009					
657TO13 Weg 367002_012					
658TO14 Weg 367002_013					
659TO15 Weg 367002_014					
660TO16/ 678BA17 Wege 367002_019/ 367025_014					
671TO17 Weg 367025_001					
673TO19 Weg 367025_003					
674TO20 Weg 367025_004					
677TO21 Weg 367025_010					
680TO22 Weg 367025_021					
682TO24 Gewässer Tränke Werkleitz					

# Ortsteile

## Glinde – Übersicht Durchführungsstände – Straßen und Gebäude

### aktuelle Maßnahmenstände

Fertiggestellt


In Bau

Bau beauftragt

Bau in Vergabe

In Planung

Maßnahmen in Pömmelte:  
Fertiggestellt

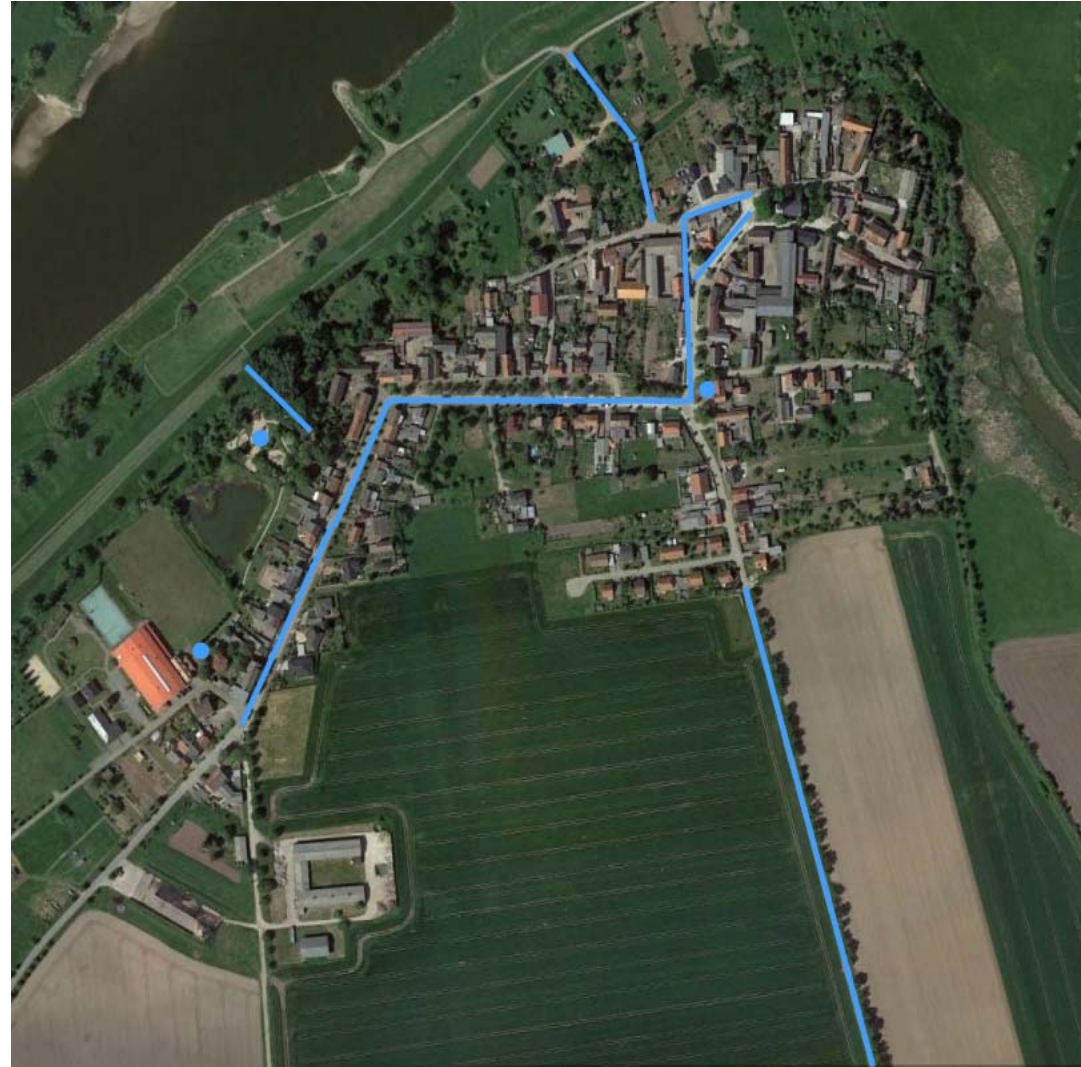

## Ortsteile

### Sachsendorf – Übersicht Durchführungsstände – ländliche Wege

Teilprojekt	In Planung	Bau in Vergabe	Bau beauftragt	In Bau	Fertiggestellt
629SA09 Weg 089026_059					
630SA08 Weg 089026_061					
631SA07 Weg 367022_004					
632SA06 Weg 367022_005					
633SA05 Weg 367022_006					
634SA04 Weg 367022_008					
635SA02 Weg 367030_011					

# Inhalte

- 1 Maßnahmenübersicht – Förderung und Investition
- 2 Maßnahmenübersicht – Sachstand Durchführung
- 3 Ortsteile – Übersicht Durchführungsstände
- 4 Einzelmaßnahmen – Stand der Durchführung

# Einzelmaßnahmen Auswahl – Stand der Durchführung

## Groß Rosenberg

Durchlass Rosmarienstr.: fertiggestellt

Sportplatz: im Bau



# Einzelmaßnahmen Auswahl – Stand der Durchführung

Lödderitz

Alte Feuerwehr



# Einzelmaßnahmen Auswahl – Stand der Durchführung

## Barby

Fahrtweg: fertiggestellt

Ziegeleiweg: fertiggestellt

Magdeburger Tor: im Bau

Gribehner Weg: im Bau

Gethsemanestr.: im Bau



# Einzelmaßnahmen Auswahl – Stand der Durchführung

**Breitenhagen: Weg 633 SA 05 (im Bau)**

Tornitz: Weg 651 TO 07 (fertig)

Tornitz: Weg 681 TO 23 (fertig)

